

# 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 2024 年度预算绩效评价报告

项目名称：2024 年自治区农村改革转移支付—夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目

项目单位：和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府

主管部门：和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府

委托单位：和布克赛尔蒙古自治县财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2025 年 7 月





## 项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	2024年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目				评价年度	2024 年
项目主管部门	和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府			联系人及联系方式	吉布吉特 15809003000	
项目实施单位	和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府			联系人及联系方式	吉布吉特 15809003000	
资金来源	一般公共预算					
2024 年投入总额	150 万元	2024 年执行数		148.54 万元	2024 年资金执行率	99.03%
发放调查问卷	46 份	回收有效问卷	46 份	满意度情况	94.89%	
采用的评价方法与评价标准	评价方法：比较法、因素分析法、公众评判法 评价标准：通用标准、计划标准、其他标准					
绩效评价结果	通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对 2024 年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 98.15 分，评价等级为“优”。					
项目主评人（签字）	李爽爽					



## 摘要

### 一、项目概述

#### 项目概述

根据《关于提前下达 2024 年自治区综合改革转移支付预算的通知》（塔地财乡财〔2023〕6 号）要求，为做好农村综合改革相关工作，下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算资金 150 万元，截至 2024 年 12 月 31 日实际到位 150 万元。资金主要用于为谢仁托热村建设围墙 2.7 公里，以改善村民居住环境，提升村庄整体面貌。采用招投标的方式确定施工单位，由施工单位包揽围墙全部工程，项目于 2024 年全部实施完成。

#### （一）项目实施情况

2024 年自治区农村改革转移支付 - 夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目，在项目实施过程中，由陈庆海（乡党委书记）统领全局工作，吉布吉特（武装部长）负责项目建设工作，王少楠（项目专干）负责项目各类手续办理，新疆正升建设工程有限责任公司建造，自然资源局、环保局、农业农村局、住建局等部门和谢仁托热村村民的积极配合，完成了新建围墙 2.7 公里，达到了改善村民居住环境，提升村庄整体面貌的效果。

#### （三）绩效目标，

##### 1.总目标

计划利用资金150万元为谢仁托热村建设围墙2.7公里，以改善村民居住环境，提升村庄整体面貌。



## 2.年度绩效目标

2024年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目年度绩效目标如下：

**表1-1 2024年度绩效目标表**

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建设围墙（公里）	≥2.7 公里
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%
	时效指标	项目计划完成时间（年月日）	2024 年 12 月 25 日前
成本指标	经济成本指标	项目总成本（万元）	≤150 万元
		项目预算控制率（%）	≤100%
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	显著改善
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	≥95%

## 二、绩效评价情况

### （一）评价结论

通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对 2024 年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 98.15 分，评价等级为“优”。

### （二）预算执行情况

2024 年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目预算资金 150 万元，资金来源为财政拨款。截止 2024 年 12 月 31 日，实际支出 148.54 万元，预算执行率为 99.03%。

### （三）项目绩效情况

2024 年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目，由和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖



乡人民政府负责实施，和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。为夏孜盖乡谢仁托热村新建围墙 2.7 公里，有效改善了居民居住环境，提升村容村貌，极大地方便和改善了居民的生活环境。总而言之，项目建设对构建和谐社会，实现共同富裕具有极大的促进作用。

### **三、经验、问题和建议**

#### **（一）主要经验及做法**

##### **1.严格执行拨付程序，确保资金使用合法合规。**

在项目实施过程中，严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，在每一次进行支付时，检查所需支付资料，同时到现场核对施工进度，确保真实产生效果；杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

##### **2.严格按照管理制度执行，确保项目实施过程合理合规。**

和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，以确保项目按时保质保量完成。

#### **（二）存在问题与不足**

##### **1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化**



单位人员绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升，需要对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。项目绩效目标表中三级指标描述不够全面，只有项目计划完成时间，未设置计划开工时间有关指标；经济成本里只有项目总成本（万元），成本指标未细化。

### **（三）建议和改进措施**

#### **1. 加强培训，提高相关人员工作水平**

采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。明确项目负责人为绩效管理第一责任人，将绩效情况纳入考核。针对职工开展目标拆解、指标细化、量化等技能培训，提升目标执行能力。



## 目 录

摘 要 .....	1
一、项目概况 .....	1
(一) 项目背景 .....	1
(二) 项目内容及规模 .....	2
(三) 资金来源及使用情况 .....	2
(四) 项目组织与管理情况 .....	3
(五) 项目绩效目标 .....	5
二、评价工作概述 .....	5
(一) 评价目的与原则 .....	5
(二) 评价方法 .....	6
(三) 绩效评价指标体系 .....	6
(四) 评价组织实施 .....	8
三、评价结论 .....	10
四、绩效评价分析 .....	12
(一) 项目决策情况 .....	12
(二) 项目过程情况 .....	14
(三) 项目产出情况 .....	16
(四) 项目效益情况 .....	18
五、主要经验及存在问题 .....	19





（一）主要经验及做法 .....	19
（二）存在问题 .....	19
六、相关建议 .....	20
七、绩效评价结果应用建议 .....	20
八、其他需要说明的问题 .....	21
附件 1 评价指标体系 .....	22
附件 2 满意度调查问卷 .....	33
附件 3 问卷调查报告 .....	38
附件 4 访谈提纲 .....	44
附件 5 基础表 .....	46
附件 6 调研照片 .....	47
附件 7 征求意见函 .....	48
附件 8 单位反馈意见 .....	49





# 2024 年自治区农村改革转移支付—夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目预算绩效评价报告

受和布克赛尔蒙古自治县财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 31 日对和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府负责管理实施的“2024 年自治区农村改革转移支付—夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目”开展了绩效评价，评价情况如下：

## 一、项目概况

### （一）项目背景

党的二十大报告提出“全面推进乡村振兴”，强调“坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动”，提出“扎实推动乡村产业、人才、文化”生态、组织振兴等重要举措，为继续做好乡村振兴这篇大文章指明了方向、提供了遵循。要全面贯彻落实党的二十大精神，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。为做好农村综合改革相关工作，根据《关于提前下达 2024 年自治区综合改革转移支付预算的通知》（塔地财乡财〔2023〕6 号）的要求，严格按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村综合改革转移支付资金绩效管理办法实施细则〉的通知》（新财规〔2020〕13 号）等文件



要求，利用下达资金 150 万元，为谢仁托热村建设围墙 2.7 公里。

## **(二) 项目内容及规模**

### **1.项目主要内容及实施情况**

项目主要内容：和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程。以科学发展观为统领，以改善农民居住环境、提高农民生活质量为出发点，从村容村貌抓起，切实加大农村基础设施建设和村容村貌整治投入，以实施新建围墙 2.7 公里进行村庄整治和整村改造的村基本整治改造完毕，努力实现被整治改造村庄从巷道到庭院，基本达到干净卫生，无暴露垃圾、无污水溢流、无乱堆乱放现象。村规民约运行有效、管理到位、群众满意。

项目实施情况：截止 2024 年 12 月 31 日，利用下达资金 150 万元，完成了谢仁托热村围墙 2.7 公里建设，改善了居民居住环境，提升了村容村貌效果。

### **2.项目规模及范围**

该项目覆盖夏孜盖乡谢仁托热村 1 个行政村，资金规模达 150 万元。

### **3.评价时段**

本项目资金的评价时段为 2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日。

## **(三) 资金来源及使用情况**

### **1.资金分配情况**



2024 年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目年初预算数 150 万元，全年预算数 150 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

## 2.资金使用情况

2024 年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目预算为 150.00 万元，实际到位数 150.00 万元，2024 年 6 月 27 日支出 120.00 万元，2024 年 10 月 24 日支出 17.50 万元，2024 年 12 月 5 日支出 11.04 万元，截至 2024 年 12 月 31 日共支出 148.54 万元，预算执行率为 99.03%。

### （四）项目组织与管理情况

#### 1.项目组织情况

本项目实施过程涉及的单位包括和布克赛尔蒙古自治县财政局、和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府、新疆正升建设工程有限责任公司、新疆汇恒百泰工程项目管理有限公司。各单位职责如下：

**和布克赛尔蒙古自治县财政局：**主要负责审核资金的年度预算及项目资金分配、拨付管理，协同各部门制定和完善资金管理办法。根据项目资金预算和项目实施结果及时拨付资金，并督导和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府对项目资金使用情况绩效评价等。

**和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府：**调研考察、项目选址、项目立项、决议公示、实施结果公示、制定项目



实施计划、支出管理制度和具体实施办法等，贯彻落实“村申报、乡审批、县审定”程序，对项目具体实施的全过程管控。

**新疆正升建设工程有限责任公司：**成交通知书、工程量清单、施工图纸、施工许可证办理、会审情况、施工组织设计编制、施工预算编制、工程合同签订等范围内的全部工作内容。

**新疆汇恒百泰工程项目管理有限公司：**负责编制可行性研究报告（代项目建议书）包括概述、项目建设背景和必要性、项目需求分析与产出方案、项目选址与要素保障、项目建设方案等内容。

## 2.资金管理情况

本项目的资金使用严格遵循了《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村综合改革转移支付资金管理办法〉的通知》（新财规〔2024〕103号）等国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。

资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用，又满足了项



目实施的实际需求。

## （五）项目绩效目标

### 1.总目标

计划利用资金150万元，为谢仁托热村新建围墙2.7公里，改善居民居住环境，提升村容村貌效果。

### 2.年度绩效目标

2024年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目年度绩效目标如下：

表1-1 2024年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建设围墙（公里）	≥2.7 公里
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%
	时效指标	项目计划完成时间（年月日）	2024 年 12 月 25 日前
成本指标	经济成本指标	项目总成本（万元）	≤150 万元
		项目预算控制率（%）	≤100%
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	显著改善
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	≥95%

## 二、评价工作概述

### （一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对 2024 年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。





## （二）评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法等多种方法，具体评价方法如下：

**比较法：**是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。分析项目成本控制情况和效益实现程度，分析项目实施产生的社会效益、经济效益、可持续性影响、满意度等效益指标，并对相关佐证资料进行逐一分析、对比分析项目预期目标的实现情况。

**因素分析法：**是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。确定分析对象和绩效目标，梳理内外部的影响因素，筛选关键因素，分析因素与绩效结果的关联性，来判断这些因素对绩效结果的影响程度，从而客观评价项目或支出绩效。

**公众评判法：**是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。问卷设计的问题应与项目紧密相关且简单、清晰明了，通过问卷调查采集受益对象对项目实施情况和实施效益的意见和建议，为项目实施产生的社会效益、满意度等提供定性与定量评价的基础。

## （三）绩效评价指标体系

### 1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、



产出效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过基础表、问卷、访谈等方式获取。

## **2.指标解释**

### **(1) 权重**

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

### **(2) 评价标准**

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

## **3.指标体系**

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准。

## **4.评价定级标准**





2024 年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分—100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80—90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60—80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件 1。

#### （四）评价组织实施

##### 1. 评价人员

本次评价委托方为和布克赛尔蒙古自治县财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次和布克赛尔蒙古自治县财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组长表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	李爽爽	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	桂富锦	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	刘春晓	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	冉熙	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	朱慧娜	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	范俊俊	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
7	康佳璐	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
8	张宗圆	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作



## 2.评价进度

本次项目的评价期间为 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 31 日，具体安排如下：

### （1）方案制定——2025 年 6 月 18 日前

受和布克赛尔蒙古自治县财政局委托后，对项目资金管理和使用情况进行调研，与和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

### （2）评价实施阶段——2025 年 6 月 30 日前

数据采集（2025 年 6 月 20 日前）。将基础表发送至和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2025 年 6 月 30 日前）。根据方案，对预算单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料 & 数据进行分析整理。

### （3）报告撰写阶段——2025 年 7 月 31 日前

撰写评价报告（2025 年 7 月 25 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

报告提交（2025 年 7 月 31 日前）。撰写完成的绩效评价报告提交和布克赛尔蒙古自治县财政局，并根据和布克赛



尔蒙古自治县财政局的安排与单位沟通确认，根据相关意见修改后形成待验收稿。

### 三、评价结论

#### （一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对“2024年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目”进行了独立客观地评价，最终评分结果为98.15分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表3-1。评分过程详见附件1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	24	22.5	93.75%
项目过程	16	15.85	99.06%
项目产出	40	40	100%
项目效益	20	19.8	99%
合计	100	98.15	98.15%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (24)	A1 项目立项 (7)	A101 立项依据充分性	4	充分	充分	4	100%
		A102 立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
	A2 绩效目标 (9)	A201 绩效目标合理性	4	合理	合理	4	100%
		A202 绩效指标明确性	5	明确	较明确	3.5	70%
	A3 资金投入 (8)	A301 预算编制科学性	4	科学	科学	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		A302 资金分配合理性	4	合理	合理	4	100%
B 项目过程 (16)	B1 资金管理 (8)	B101 资金到位率	2	100%	100%	2	100%
		B102 预算执行率	3	100%	99.03%	2.85	95%
		B103 资金使用合规性	3	合规	合规	3	100%
	B2 组织实施 (8)	B201 管理制度健全性	4	健全	健全	4	100%
		B202 制度执行有效性	4	执行且有效	执行且有效	4	100%
C 项目产出 (40)	C1 产出数量(10)	C101 建设围墙(公里)	10	≥2.7 公里	2.7 公里	10	100%
	C2 产出质量(10)	C201 项目验收合格率(%)	10	100%	100%	10	100%
	C3 产出时效(10)	C301 项目计划完成时间(年月日)	10	2024 年 12 月 25 日前	2024 年 8 月 21 日	10	100%
	C4 产出成本(10)	C401 预算控制率	10	≤150 万元	148.54 万元	10	100%
D 项目效益 (20)	D1 实施效益(10)	D101 改善居民居住环境	10	显著改善	显著改善	10	100%
	D2 满意度(10)	D201 受益居民满意度(%)	10	≥95%	94.89%	9.8	98%
总分			100			98.15	98.15%

## (二) 项目绩效情况

2024 年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目，为夏孜盖乡谢仁托热村新建围墙 2.7 公里，项目建成后有效地改善了谢仁托热村村民生活环境，提升了生活质量，改善了居民居住环境，达到了提升村容村貌效果。同时也惠及了周边村镇的群众，为夏孜盖乡夯实乡村振兴生态基础，推进了农村人居环境整治，提升了美丽乡村建设水平，推动了美丽乡村走向健康乡村，增进广大农村居民的生态福祉，构建和谐社会新家园起到积极作用。对当地的社会效益和经济效益产生了深远的影响。



## 四、绩效评价分析

### （一）项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 24 分，绩效评价得分 22.5 分，得分率 93.75%，具体分析如下：

#### 1.项目立项

##### （1）立项依据充分性：

经查证，《2024 年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目可行性研究报告》《2024 年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目立项的批复通知》《关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》（塔地财乡财〔2023〕6 号），该项目以以上文件立项；②该项目根据财政局要求，按照《国家重点建设项目建设管理办法》（中华人民共和国国务院令 58 号）《关于全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化的意见》《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《关于推动农村人居环境标准体系建设的指导意见》为指导，与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③该项目符合国家相关法律法规及发展政策，符合“十四五”规划要求，围绕本年度工作重点，与项目单位职责密切相关。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

##### （2）立项程序规范性：





经调研①立项前经过必要的风险评估、绩效评估和集体决策等；②项目立项符合规定程序。③审批文件和材料保管完整齐全。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

## 2.绩效目标

### （1）绩效目标合理性：

①根据该项目绩效目标申报表，本项目设立了总目标和年度目标；②据调研该项目绩效目标申报表中年度目标合理、可衡量、可实现和总目标相关。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

### （2）绩效指标明确性：

①项目绩效目标表中经济成本指标，项目总成本（万元），未设置经济成本其他指标，指标未细化；时效指标设置不全面，只有项目计划完成时间，未设置计划开工时间相关指标。②项目根据《夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程实施方案》、《关于提前下达 2024 年自治区综合改革转移支付预算的通知》（塔地财乡财〔2023〕6 号）相关要求，设置本项目总目标和年度绩效目标，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③项目目标任务数或计划数相对应。此项目预算金额为 150 万元，项目绩效目标表中成本指标设置为 150 万元。



综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得3.5分，得分率70%。

### 3.资金投入

#### （1）预算编制科学性：

①经查证《关于提前下达 2024 年自治区综合改革转移支付预算的通知》（塔地财乡财〔2023〕6号）、《夏孜盖乡人民政府支出管理制度》等相关项目资料，可知该项目预算编制经过了科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；②根据项目实施方案，该项目预算编制足够细化。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

#### （2）资金分配合理性：

①根据《关于提前下达 2024 年自治区综合改革转移支付预算的通知》（塔地财乡财〔2023〕6号），该项目资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与地方实际适应。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

### （二）项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 16 分，绩效评价得分 15.85 分，得分率 99.06%，具体分析如下：

#### 1.资金管理

##### （1）资金到位率：





该项目 2024 年预算安排 150 万元，实际到位资金为 150 万元，资金到位率 100%。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

### （2）预算执行率：

2024 年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目预算资金为 150 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际支出 148.54 万元，预算执行率为 99.03%。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 2.85 分，得分率 95%。

### （3）资金使用合规性：

本项目的资金使用严格遵循《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村综合改革转移支付资金绩效管理办法实施细则〉的通知》（新财规〔2020〕13 号）等国家相关法律法规与财务制度，确保资金的合规性与安全性。在项目执行过程中实行专人管理，项目资金专人核算，保证资金专款专用，严格按照项目预算执行。项目负责人根据项目计划和项目执行进度申请使用资金，严格按照财务管理制度履行审批程序，自觉接受监督检查，确保项目资金使用安全有效，执行期间未发现违规执行项目资金情况发生。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

## 2.组织实施



### （1）管理制度健全性：

①本项目遵守《国家重点建设项目管理办法》《和布克赛尔蒙古自治县土地利用规划》《新疆维吾尔自治区实施建设项目法人责任制暂行办法》《塔城地区建设项目管理办法》《建设项目基建财务管理规定》等规定实施管理；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

### （2）制度执行有效性：

①根据《新疆维吾尔自治区实施建设项目法人责任制暂行办法》《塔城地区建设项目管理办法》《建设项目基建财务管理规定》《项目管理办法》《施工许可证》《可行性研究报告》《开工报告》《三重一大会议纪要》等国家相关法律法规与制度业务管理执行；②项目不涉及变更；③经调研项目合同书、项目验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

## （三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 40 分，绩效评价得分 40 分，得分率 100%，具体分析如下：

### 1.产出数量

#### （1）建设围墙（公里）



根据和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府提供的2024年工作计划、基础表，2024年需要完成新建围墙长度2.7公里，截至2024年12月31日新建围墙长度建设2.7公里。

综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得10分，得分率100%。

## 2.产出质量

### （1）项目验收合格率（%）

根据调查项目工程验收单，验收情况为合格，与目标值一致。

综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得10分，得分率100%。

## 3.产出时效

### （1）项目计划完成时间（年月日）

根据调查项目工程验收单，验收时间为2024年8月21日，在规定时间内已完成。

综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得10分，得分率100%。

## 4.产出成本

### （1）预算控制率

2024年该项目资金到位数为150万元，计划用150万元支付该项目费用，根据单位提供的国库支付凭证、记账凭证



可知该项目于2024年12月5日完成项目款148.54万元支付，预算控制在99.03%，成本节约了。

综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得10分，得分率100%。

#### **（四）项目效益情况**

从评价得分情况看，此项评价满分为20分，绩效评价得分19.8分，得分率99%，具体分析如下：

##### **1.项目效益**

###### **（1）改善居民居住环境**

根据项目的满意度调查及项目成效报告，2024年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目对生活居住环境有效改善。根据对居住居民的满意度调查问卷可知问题“你对2024年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目的实施是否满意？”的满意度为95.65%。

综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得10分，得分率100%。

##### **2.满意度**

###### **（1）受益居民满意度**

根据对受益居民的满意度调查问卷可知问题“你对2024年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目在惠及当地群众满意度？”的满意度为94.35%。



综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 9.8 分，得分率 98%。

## **五、主要经验及存在问题**

### **（一）主要经验及做法**

#### **1.严格执行拨付程序，确保资金使用合法合规。**

在项目实施过程中，严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，在每一次进行支付时，检查所需支付资料，同时到现场核对施工进度，确保真实产生效果；杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

#### **2.严格按照管理制度执行，确保项目实施过程合理合规。**

和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，以确保项目按时保质保量完成。

### **（二）存在问题**

#### **1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化**

单位人员绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升，需要对各项指标和指标值要进一步优化、



完善，主要在细化、量化上改进。项目绩效目标表中三级指标描述不够全面，只有项目计划完成时间，未设置计划开工时间有关指标；经济成本里只有项目总成本（万元），成本指标未细化。

## 六、相关建议

**加强培训，提高相关人员工作水平：**采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。明确项目负责人为绩效管理第一责任人，将绩效情况纳入考核。针对职工开展目标拆解、指标细化、量化等技能培训，提升目标执行能力。

## 七、绩效评价结果应用建议

### （一）及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平，并在规定的时间内将整改情况向和布克赛尔蒙古自治县财政局汇报。

### （二）下一年度预算安排

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的项目，可依照相关政策制度，结合和布克赛尔蒙古自治县人民政府工作安排以及和布克赛尔蒙古自治县财力情况等因素，原则上优先予以保障。





### **（三）评价结果公开**

结合预算管理有关要求，和布克赛尔蒙古自治县财政局可以选择将此次评价结果对外公开，同时可将本次绩效评价结果向和布克赛尔蒙古自治县政府报告，为政府决策提供参考。

### **八、其他需要说明的问题**

本次评价涉及的相关数据由和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府提供的资料中提取，评价组在对收集的数据进行分析的基础上，结合对相关单位的访谈对本项目的实施效果进行客观评价，评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果。





## 附件 1 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A项目决策 (24)	A1 项目立项 (7)	A101 立项依据充分性	4	考察项目立项的依据文件是否充分,是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察①有相关政策依据(国家、省部级或市级政策依据);②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配;③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占 1/3 权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。	经查证,《2024 年自治区农村改革转移支付-夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目可行性研究报告》《2024 年自治区农村改革转移支付-夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目立项的批复通知》《关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》(塔地财乡财〔2023〕6 号)立项;②该项目根据财政局要求,按照《国家重点建设项目管理办法》(中华人民共和国国务院令 58 号)《关于全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化的意见》《中共中	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《关于推动农村人居环境标准体系建设的指导意见》该项目以以上文件立项； ③该项目符合国家相关法律法规及发展政策，符合“十四五”规划要求，围绕本年度工作重点，与项目单位职责密切相关。根据评分标准，该项指标得4分。		
		A102 立项程序规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	考察三点：①立项前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。	经调研①单位提供的《和布克赛尔县夏孜盖乡谢仁托热村容村貌提升工程项目可行性研究报告（代项目建议书）》可知该项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目立项符合规定程序。③审批文	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								件和材料保管完整齐全。根据评分标准，该项指标得 3 分。		
	A2 绩效目标 (9)	A201 绩效目标合理性	4	考察是否设立了项目总目标及年度目标,以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得 20%的权重分（两项各占 10%的权重分）；②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得 1/6 的剩余权重分。	①根据该项目绩效目标申报表，本项目设立了总目标和年度目标；②据调研该项目绩效目标申报表中年度目标合理、可衡量、可实现和总目标相关。根据评分标准，该项指标得 4 分。	4	100%
		A202 绩效指标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得 30%权重分，不满足得零分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满足得 40%权重分，不满足得零分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得 30%权重分，不满足得零分。	①项目绩效目标表中经济成本指标，项目总成本（万元），未设置经济成本其他指标，指标未细化；时效指标设置不全面，只有项目计划完成时间，未设置计划开工时间相关指标。②项目根据《夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程实施方案》、	3.5	70%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								《关于提前下达 2024 年自治区综合改革转移支付预算的通知》（塔地财乡财〔2023〕6 号）相关要求，设置本项目总目标和年度目标绩效目标，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③项目目标任务数或计划数相对应。此项目预算金额为 150 万元，项目绩效目标表中成本指标设置为 150 万元。综上，该指标得 3.5 分。		
	A3 资金投入（8）	A301 预算编制科学性	4	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	①经查证《关于提前下达 2024 年自治区综合改革转移支付预算的通知》（塔地财乡财〔2023〕6 号）、《夏孜盖乡人民政府支出管理制度》资金支付	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								明细等相关项目资料，可知该项目预算编制经过了科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。②根据项目实施方案，该项目预算编制足够细化；综上所述该指标得4分。		
		A302 资金分配合理性	4	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	①根据《关于提前下达2024年自治区综合改革转移支付预算的通知》（塔地财乡财〔2023〕6号），该项目资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与地方实际适应。综上所述该指标得4分。	4	100%
B 项目过程	B1 资金管理	B101 资金到	2	反映项目预	100%	通用标准	资金到位率达100%则	该项目2024年预算安	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
(16)	(8)	位率		算资金的实际到位情况; 资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%			得满分, 低于则每降低1%扣相应权重的 5%, 扣完为止。	排 150 万元, 实际到位资金为 150 万元, 资金到位率 100%。综上所述该指标得 2 分。		
		B102 预算执行率	3	反映项目预算资金的实际执行情况; 预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	预算执行率达 100%则得满分, 低于则每降低1%扣相应权重的 5%, 扣完为止。	2024 年自治区农村改革转移支付-夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目预算资金为 150 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 该项目实际支出 148.54 万元, 预算执行率为 99.03%。综上所述该指标得 2.85 分。	2.85	95%
		B103 资金使用合规性	3	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;	本项目的资金使用严格遵循《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村综合改革转移支付资金绩效管理办法实施细则〉的通知》(新财规〔2020〕13 号等国家相关法律法规与	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上四项均符合得满分，否则不得分。	财务制度，确保资金的合规性与安全性。在项目执行过程中实行专人管理，项目资金专人核算，保证资金专款专用，严格按照项目预算执行。项目负责人根据项目计划和项目执行进度申请使用资金，严格按照财务管理制度履行审批程序，自觉接受监督检查，确保项目资金使用安全有效，执行期间未发现违规执行项目资金情况发生。 综上所述该指标得3分。		
	B2 组织实施 (8)	B201 管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度	健全	通用标准	考察实施单位①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占 50%的权重	①本项目遵守《国家重点建设项目管理办法》《和布克赛尔蒙古自治县土地利用规划》《新疆维吾尔自治区实施建设项目法	4	100%





一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				对项目顺利实施的保障情况。			分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	人责任制暂行办法》《塔城地区建设项目管理办法》《建设项目基建财务管理规定》等规定实施管理； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 综上所述该指标得 4 分。		
		B202 制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上四项各占 25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	①根据《新疆维吾尔自治区实施建设项目法人责任制暂行办法》《塔城地区建设项目管理办法》《建设项目基建财务管理规定》《项目管理规定》《施工许可证》《可行性研究报告》《开工报告》《三重一大会议纪要》等国家相关法律法规与制度业务管理执行；②项目不涉及变更；③经调研项目合同书、项目验收报告、技术	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。综上所述，该指标得4分。		
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (10)	C101 建设围墙 (公里)	10	考察项目新建围墙长度完成情况	$\geq 2.7$ 公里	计划标准	考察项目绩效目标在一定时期（本年度或项目期）内计划完工建设的工程量；达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	根据和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府提供的2024年工作计划、基础表发现，2024年需要完成新建围墙长度2.7公里。截至2024年12月31日新建围墙长度建设2.7公里。根据评分标准，本指标得满分。	10	100%
	C2 产出质量 (10)	C201 项目验收合格率 (%)	10	考察项目工程竣工验收情况	=100%	计划标准	项目相关验收资料验收合格为满分，不合格则不得分。	根据调查项目工程验收单，验收情况为合格，与目标值一致，该指标得10分。	10	100%
	C3 产出时效 (10)	C301 项目计划完成时间 (年月日)	10	考察项目按照计划完工时间	2024年12月25日前	计划标准	项目完成时间在规定时间内完成得满分，否则不得分。	根据调查项目工程验收单，验收时间为2024年8月21日，在规定时间内已完成，该指标得满分。	10	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	C4 产出成本 (10)	C401 预算控制率	10	考察项目实际支出和计划支出的比率,是否节约成本	$\leq 100\%$	计划标准	预算控制率 $\leq 100\%$ 得满分, 否则不得分。	根据调查 2024 年该项目资金到位数 150 万元, 计划用 150 万元支付该项目费用, 根据单位提供的国库支付凭证、记账凭证可知该项目于 2024 年 12 月 5 日完成项目款 148.54 万元支付, 预算控制率为 99.03%, 成本节约了, 该指标得满分。	10	100%
D 项目效益 (20)	D1 项目效益 (10)	D101 改善居民居住环境	10	考察 2024 年自治区农村改革转移支付-夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目对生活居住环境的改善情况	显著改善	计划标准	考察项目实施后是否改善居民居住环境。根据满意度问卷回收情况, 调查人员的满意度 100%-85% (含 85%) 得 10 分, 满意度 85%-60% (含 60%) 得 7 分, 满意度 60% 以下不得分。	根据项目的满意度调查及项目成效报告, 2024 年自治区农村改革转移支付-夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目对生活居住环境有效改善。根据对居住居民的满意度调查问卷可知问题“你对 2024 年自治区农村改革转移支付-夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升	10	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								工程项目的实施是否满意？”的满意度为95.65%该指标得满分。		
	D2 满意度 (10)	D201 受益居民满意度 (%)	10	考察项目区附近居民对该项目的满意度	>=95%	其他标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%，扣除0.2分，不足1%按1%扣分，扣完为止。	根据对受益居民的满意度调查问卷可知问题“你对2024年自治区农村改革转移支付-夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目在惠及当地群众满意度？”的满意度为94.35%。根据评分标准，该指标得9.8分。	9.8	98%
总分	100		100						98.15	98.15%



## 附件 2 满意度调查问卷

### 夏孜盖乡谢仁托热村容村貌提升工程项目周边常住 居民满意度问卷

亲爱的先生/女士：

您好！受和布克赛尔蒙古自治县财政局委托方委托，我公司对和布克赛尔蒙古自治县 2024 年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目周边的群众满意度情况展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2025 年 7 月 13 日

1. 您的性别是

A: 男

B: 女

答案: -----

2. 您家里近几年的农产品收益情况

A: 良好

B: 一般

C: 不好

答案: -----

3. 您认为村里现有的基础设施情况如何

A: 完善

B: 基本完善



C: 不完善

答案: -----

4. 您认为村里的居住环境是否需要提高?

A: 是

B: 否

答案: -----

5. 您认为 2024 年自治区农村改革转移支付 - 夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目实施后, 是否改善村民居住环境?

A: 是

B: 否

答案: -----

6. 您认为 2024 年自治区农村改革转移支付 - 夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目实施后, 是否保护了村民的财产安全?

A: 是

B: 否

答案: -----

7. 您家里收入的主要来源?

A: 农产品收入

B: 养殖业

C: 家庭副业

D: 外出打工

E: 其他, 请填写 -----

答案: -----

8. 您认为针对村里的特点, 最适合进行的生产是?





A: 农作物生产

B: 旅游业

C: 畜牧业

D: 其他副业

答案: -----

9. 您对本村状况最不满意的的地方在哪里?

A: 乡村规划不合理

B: 卫生条件差

C: 饮用水不达标

D: 居住环境

答案: -----

10. 您最希望村里进行哪方面改造?

A: 进村和村内道路

B: 自来水

C: 卫生设施

D: 围墙

E: 学校

F: 其他, 请填写 -----

答案: -----

11. 您觉得农村村容村貌不整洁的主要原因是?

A: 村民环保意识不强

B: 政府宣传不到位

C: 农村自身环境就差

D: 其他, 请填写 -----



答案: -----

12. 您对 2024 年自治区农村改革转移支付 - 夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目施工环境情况的满意度?

A: 1 分

B: 2 分

C: 3 分

D: 4 分

E: 5 分

答案: -----

13. 您对 2024 年自治区农村改革转移支付 - 夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目建设安全警示措施的满意度?

A: 1 分

B: 2 分

C: 3 分

D: 4 分

E: 5 分

答案: -----

14. 你对 2024 年自治区农村改革转移支付 - 夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目的实施是否满意?

A: 1 分

B: 2 分

C: 3 分

D: 4 分

E: 5 分



答案: -----

15. 你对 2024 年自治区农村改革转移支付 - 夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目在惠及当地群众满意度?

A: 1 分

B: 2 分

C: 3 分

D: 4 分

E: 5 分

答案: -----

16. 您对该项目有什么意见和建议?

答案: -----



## 附件 3 问卷调查报告

### 2024 年自治区农村改革转移支付 - 夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目周边常住居民满意度问卷报告

#### 一、调研对象与调研内容

##### （一）调研对象

本次调研对象为该项目周边常住居民。

##### （二）调研内容

##### 1. 单选题：

您的性别是

您家里近几年的农产品收益情况

您认为村里现有的基础设施情况如何

您认为村里的居住环境是否需要提高？

您认为 2024 年自治区农村改革转移支付 - 夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目实施后，是否改善村民居住环境？

您认为 2024 年自治区农村改革转移支付 - 夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目实施后，是否保护了村民的财产安全？

##### 2. 多选题：

您家里收入的主要来源？

您认为针对村里的特点，最适合进行的生产是？

您对本村状况最不满意的的地方在哪里？

您最希望村里进行哪方面改造？

您觉得农村村容村貌不整洁的主要原因是？

##### 3. 满意度问题：



您对2024年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目施工环境情况的满意度？

您对2024年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目建设安全警示措施的满意度？

您对2024年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目的实施是否满意？

您对2024年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目在惠及当地群众满意度？

## 二、调研方法与抽样方式

### （一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

### （二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式是线上随机抽样。

## 三、问卷的发放和回收

问卷发放 46 份，回收有效问卷 46 份。

## 四、调查问卷的信度与效度分析

### 1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach  $\alpha$ ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left( 1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$



其中  $K$  表示问卷中问题的数目， $\sigma_i^2$  为第  $i$  个问题得分的方差， $\sigma_T^2$  为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7 ~ 0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次 2024 年自治区农村改革转移支付 - 夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目的信度为 0.99

## 2.效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于 -1 与 +1 之间。即  $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$  表示两变量正相关； $r < 0$  表示两变量负相关； $|r| = 0$  表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$  表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$  表示两变量存在一定程度的线性相关，其中  $0 < |r| < 0.3$  为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$  为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$  为显著相关， $0.8 < |r| < 1$  为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表 1。





附表 1 2024 年自治区农村改革转移支付 - 夏孜盖乡谢仁托热村  
村容村貌提升工程项目问卷效度汇总

题目	效度得分
您对 2024 年自治区农村改革转移支付 - 夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目施工环境情况的满意度?	0.98
您对 2024 年自治区农村改革转移支付 - 夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目建设安全警示措施的满意度?	0.99
你对 2024 年自治区农村改革转移支付 - 夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目在惠及当地群众满意度?	0.98
你对 2024 年自治区农村改革转移支付 - 夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目的实施是否满意?	0.99

## 五、调查问卷的分析

### 1.单选题

#### 1) 您的性别是

在 46 份有效问卷中,被调查对象中选男的比例为 50%,选女的比例为 50%。

#### 2) 您家里近几年的农产品收益情况

在 46 份有效问卷中,被调查对象中选良好的比例为 71.74%,选一般的比例为 28.26%,选不好的比例为 0%。

#### 3) 您认为村里现有的基础设施情况如何

在 46 份有效问卷中,被调查对象中选完善的比例为 58.7%,选基本完善的比例为 36.96%,选不完善的比例为 4.35%。

#### 4) 您认为村里的居住环境是否需要提高?



在 46 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 88.89%，选否的比例为 11.11%。

5)您认为 2024 年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目实施后，是否改善村民居住环境？

在 46 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。

6)您认为 2024 年自治区农村改革转移支付－夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目实施后，是否保护了村民的财产安全？

在 46 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。

## 2.多选题

1) 您家里收入的主要来源？

在 46 份有效问卷中，被调查对象中选农产品收入的比例为 51.61%，选养殖业的比例为 19.35%，选家庭副业的比例为 6.45%，选外出打工的比例为 16.13%，选其他，请填写\_\_\_\_\_的比例为 6.45%。

2) 您认为针对村里的特点，最适合进行的生产是？

在 46 份有效问卷中，被调查对象中选农作物生产的比例为 58.57%，选旅游业的比例为 15.71%，选畜牧业的比例为 15.71%，选其他副业的比例为 10%。

3) 您对本村状况最不满意的的地方在哪里？

在 46 份有效问卷中，被调查对象中选乡村规划不合理的比例为 32.76%，选卫生条件差的比为 24.14%，选饮用水不达标的不比例为 27.59%，选居住环境的比例为 15.52%。

4) 您最希望村里进行哪方面改造？

在 46 份有效问卷中，被调查对象中选进村和村内道路的比例为 20%，选自来水的比例为 27.06%，选卫生设施的比例为 25.88%，选围墙的比例为 16.47%，选学校的比例为 3.53%，选其他，请填写\_\_\_\_\_的比例为 7.06%。




### 5) 您觉得农村村容村貌不整洁的主要原因是?

在 46 份有效问卷中, 被调查对象中选村民环保意识不强的比例为 55.36%, 选政府宣传不到位的比例为 10.71%, 选农村自身环境较差的比例为 26.79%, 选其他, 请填写\_\_\_\_\_的比例为 7.14%。

### 3.满意度题

根据问卷调查显示, 受益对象的整体满意程度为 94.89%, 满意度水平较高。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为: 您对 2024 年自治区农村改革转移支付-夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目施工环境情况的满意度? (93.91%)、您对 2024 年自治区农村改革转移支付-夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目建设安全警示措施的满意度? (95.65%)、你对 2024 年自治区农村改革转移支付-夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目的实施是否满意? (95.65%)、你对 2024 年自治区农村改革转移支付-夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目在惠及当地群众满意度? (94.35%)。具体如下图所示。

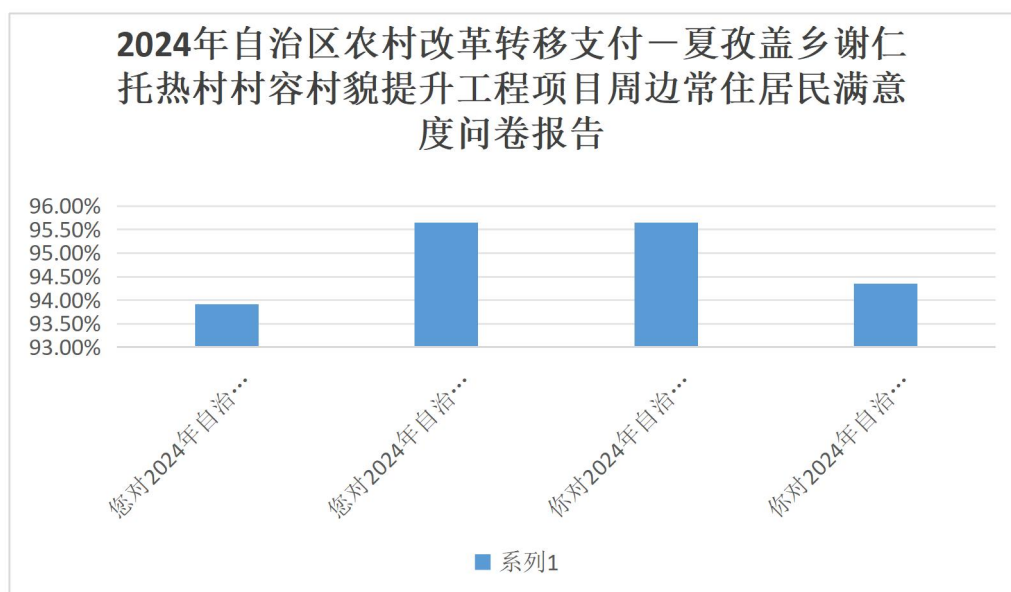

### 六、意见及建议

无。



## 附件 4 访谈提纲

### 2024 年自治区农村改革转移支付-夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目相关负责人访谈提纲

1.请您从以下几点谈谈该项目的概况。

(1) 项目立项时间与背景;

(2) 项目立项的目标;

(3) 2024 年自治区农村改革转移支付-夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目资金实施内容与实施情况;

(4) 该项目取得的成绩与经验做法。

2.请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和拨付流程。

3.请您简要介绍该项目经费项目实施的关键环节有哪些?针对各环节已制定的管理办法有哪些?以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。

4.请您谈谈作为项目实施单位,为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作?

5.该项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些?相互之间是如何联合确保项目顺利开展的?

6.通过本项目经费,您认为是否达到了其预期效果?

7.请您谈谈该项目实施过程中出现的问题或难点,以及下一步的工作规划。

8.请您简要说明一下,单位财务管理制度是否健全?对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作?

9.根据《2024 年自治区农村改革转移支付-夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目工程施工合同》计划竣工日期是 2024 年 8 月 18 日,为什么竣工验收日期是 2024 年 8 月 21 日和合同日期不同?项目总投资是 150 万元,为什么施工合同价格为 141.84 万元?



访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
	李 强	15809030000	



## 附件 5 基础表

附件 5 基础表

2024 年自治区农村改革转移支付-夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目数据需求表

序号	指标名称	年初计划数	实际完成数	备注
1	新建围墙公里数	>=2.7 公里	2.7 公里	各指标数量完成情况需提供相关材料原件或复印件进行证明
2	项目中标时间	2024 年 5 月 28 日	2024 年 5 月 28 日	
3	签订合同日期	2024 年 5 月 30 日	2024 年 5 月 30 日	
4	建设围墙资金支出	<=150 万元	148.54 万元	
5	项目开工时间	2024 年 5 月 30 日前	2024 年 5 月 30 日	
6	项目竣工时间	2024 年 8 月 18 日前	2024 年 8 月 21 日	
填写单位：和布克赛尔县夏孜盖乡人民政府 填写人：吉布吉特 联系电话：15809003000				
备注：本表由和布克赛尔县夏孜盖乡人民政府单位填写并加盖公章，部分数据需证明材料				





## 附件 6 调研照片

### 调研照片





## 附件 7 征求意见函

# 新疆和布克赛尔蒙古自治县财政局

## 2024 年自治区农村改革转移支付—夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目绩效评价报告征求意见函

和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府：

现将对你单位的绩效评价报告送达给你单位。请你单位于 2025 年 8 月 12 日 19 点前，提出书面意见或说明纸质版，反馈至和布克赛尔蒙古自治县财政局。逾期未回复，视为无异议。

望回函。

附：《2024 年自治区农村改革转移支付—夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目绩效评价报告-征求意见稿》



和布克赛尔县财政局

2025 年 8 月 11 日

备注：征求意见函一式两份，一份送达被评价单位，一份评价单位留存并纳入评价报告归档。



## 附件 8 单位反馈意见

被评价单位意见或说明
<p>无意见。</p> <p>负责人签字: </p> <p>联系电话: 15801003000</p> <p>被评价单位公章: </p> <p>2025 年 8 月 11 日</p>

备注: 被评价单位意见或说明可另页提供, 并签注“意见另附”
